

Testaktivitäten 2006/2007

target


Stand Oktober 2006

TARGET2- / SSP-Tests

T2 User Testing: Allgemeines

User Tests finden üblicherweise innerhalb des eigenen Migrationsfensters statt.

Während Überlappungen der Testmöglichkeiten mit anderen Fenstern kann auch mit anderen Migrationsgruppen getestet werden.

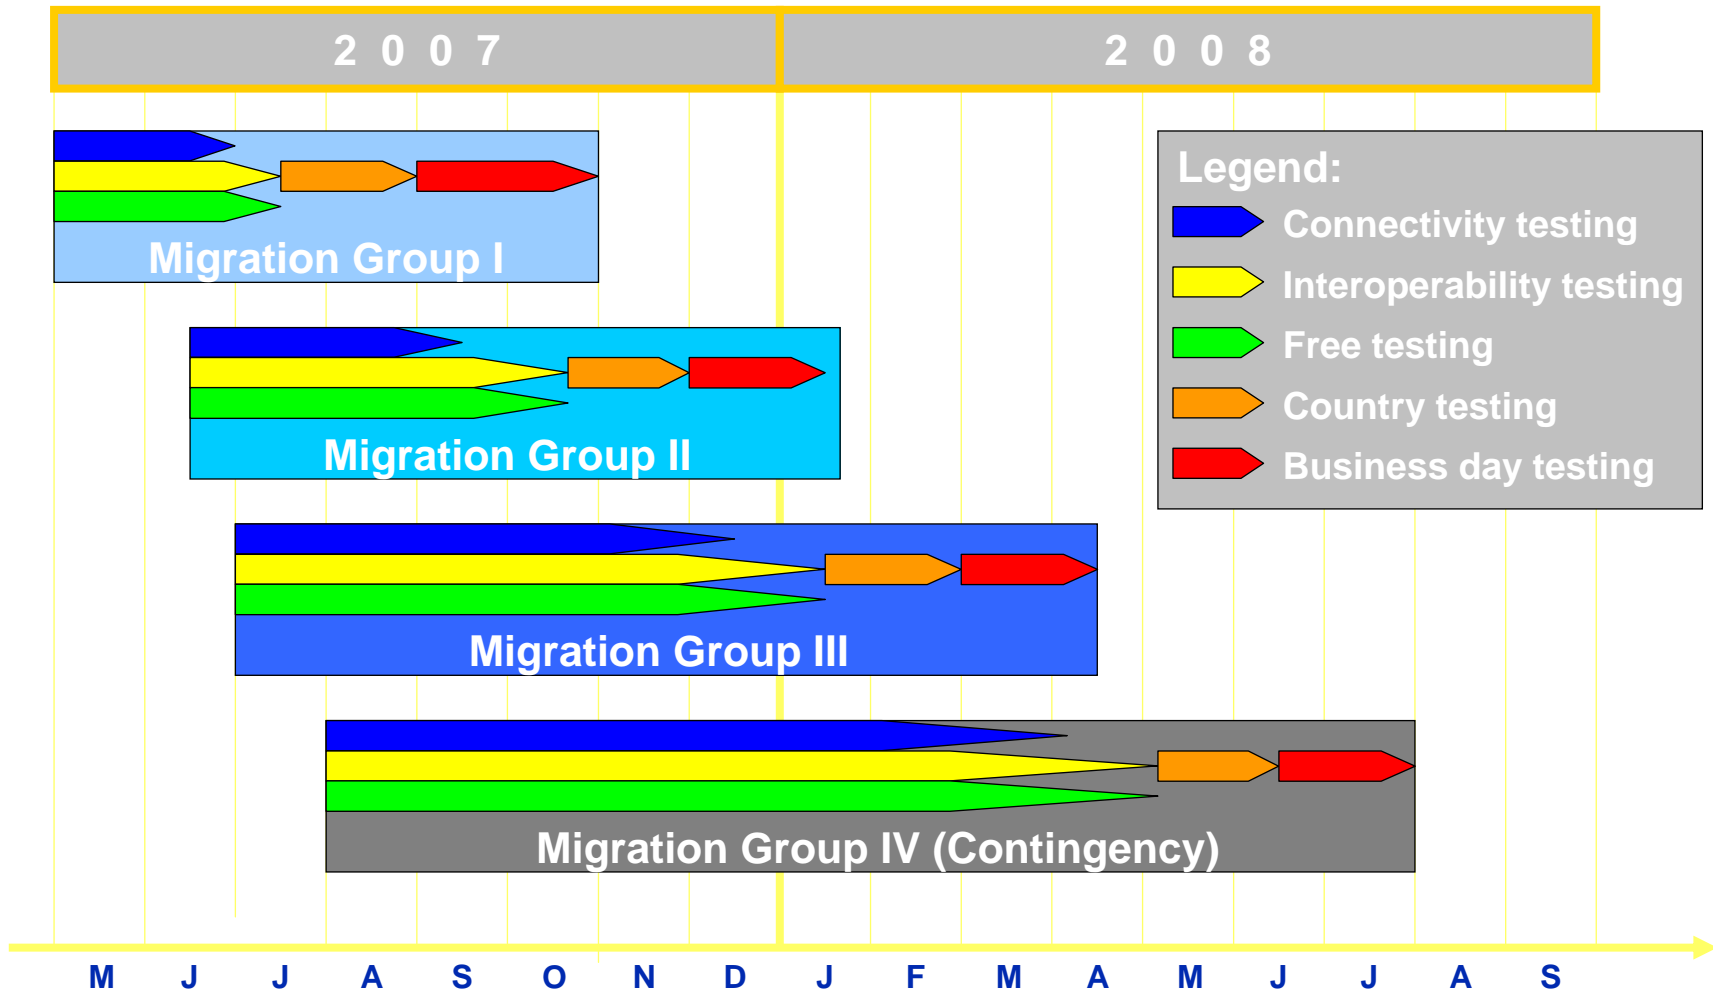

T2 User Testing: Verantwortlichkeiten 1/2

- **DP ist verantwortlich für:**
 - zeitgerechte und gewissenhafte Ausführung der Testszenarien
 - die Testbereitschaft ihrer IP
 - regelmäßiges Einholen von Informationen von T2TRIS
 - selbstständiges und rechtzeitiges Registrieren bei SWIFT für T2
- **Service Desk der Notenbank ist zuständig für:**
 - Fragen und Support bei Usertests
 - Migrationsplanung des eigenen Landes
 - Informationsweitergabe an ihre Teilnehmer
 - An- und Abmeldung ihrer Teilnehmer
 - Überwachung der Geschäfte, Zahlungsaktivitäten, Liquiditätsströme, Profile
 - Monitoren der Bereitschaft ihrer Teilnehmer
 - Contingency-Maßnahmen (in Arbeit)

T2 User Testing: Verantwortlichkeiten 2/2

- **Verantwortung der ECB:**
 - Koordination der verschiedenen Aktivitäten
 - Bereitstellung regelmäßiger Updates und Aktualisierung des T2TRIS
 - Change Management Control
 - Sammeln und Verteilen von testrelevanten Informationen
 - Monitoren der Testaktivitäten
- **Aufgaben des SSP Service Desk:**
 - Verfügbarkeit der Testumgebung
 - Zurverfügungstellen von technischem Service

Verfügbarkeit der Testumgebung (SSP-Tests)

- Montag bis Donnerstag von 8.00 – 16.00 Uhr (+ 1 h end-of-day procedures)
- Freitag 8.00 – 14.00 Uhr (+ 1 h end-of-day procedures)
- Einen Freitag pro Monat geschlossen

Testphasen SSP/OeNB/AT Banken/Kunden

Zeitraum	Uhrzeit	DP	IP ^{via} OeNB	Aktion
01/07-03/07	MO – DO 9:00 – 15:00	X	X	Start Testphase - HOAM.AT mit AT-Banken/Kunden
ca. 03/2007		X	X	Test eKonto
05-06/2007	MO – DO 8:00 – 16:00 FR 8:00 – 14:00 + 1h EoD Procedures	○*	X	Connectivity testing
05-07/2007		○	X	Interoperability testing / certification
05-09/2007		○	X	Interoperability testing / free testing
08-09/2007		○	X	Country testing
September - 5.11.2007		○	X	Business day testing
19.11.2007		X	X	Live Operations

* direkt mit SSP, OeNB ist Supervisor

Testphasen

- **hoam.at ZV intern**
 - (Oktober – November 2006)
- **hoam.at OeNB intern**
 - (November – Dezember 2006)
- **hoam.at mit OeNB Kontoinhabern**
 - (Jänner – März 2007)
- **SSP 3CB-intern mit Vertretern der Notenbanken (3CBIAC)**
 - (Dezember 2006 – Jänner 2007)
- **SSP Notenbanken**
 - (Jänner 2007 – April 2007)
- **SSP Kommerzbanken national**
 - (Mai 2007 – September 2007)
- **SSP Kommerzbanken alle Teilnehmer eines Fensters**
 - (September 2007 – 5. November 2007)

Test Kick-Off II / Testmanagermeetings

- **Kick-Off II: 14.11.2006**
- **Testmanagermeetings ab 14.12.2006, (nach einer Mittagspause) anschließend ans NMT 13.30 bis 16.00 Uhr**
